


段階揚水試験結果

ボーリング 00000000#777

工事名	さく井工事			2号井
試験日	2011年 02月 27日	自然水位	GL-	6.23 m
適正揚水量	320 ℓ/min (460 m ³ /day)	適正揚水位	GL-	7.93 m
限界揚水量	400 ℓ/min (576 m ³ /day)	限界揚水位	GL-	8.52 m
最大揚水量	600 ℓ/min (864 m ³ /day)	最大揚水位	GL-	13.28 m
適正揚水量の判定		限界揚水量の80%		水温 14.4
備考				

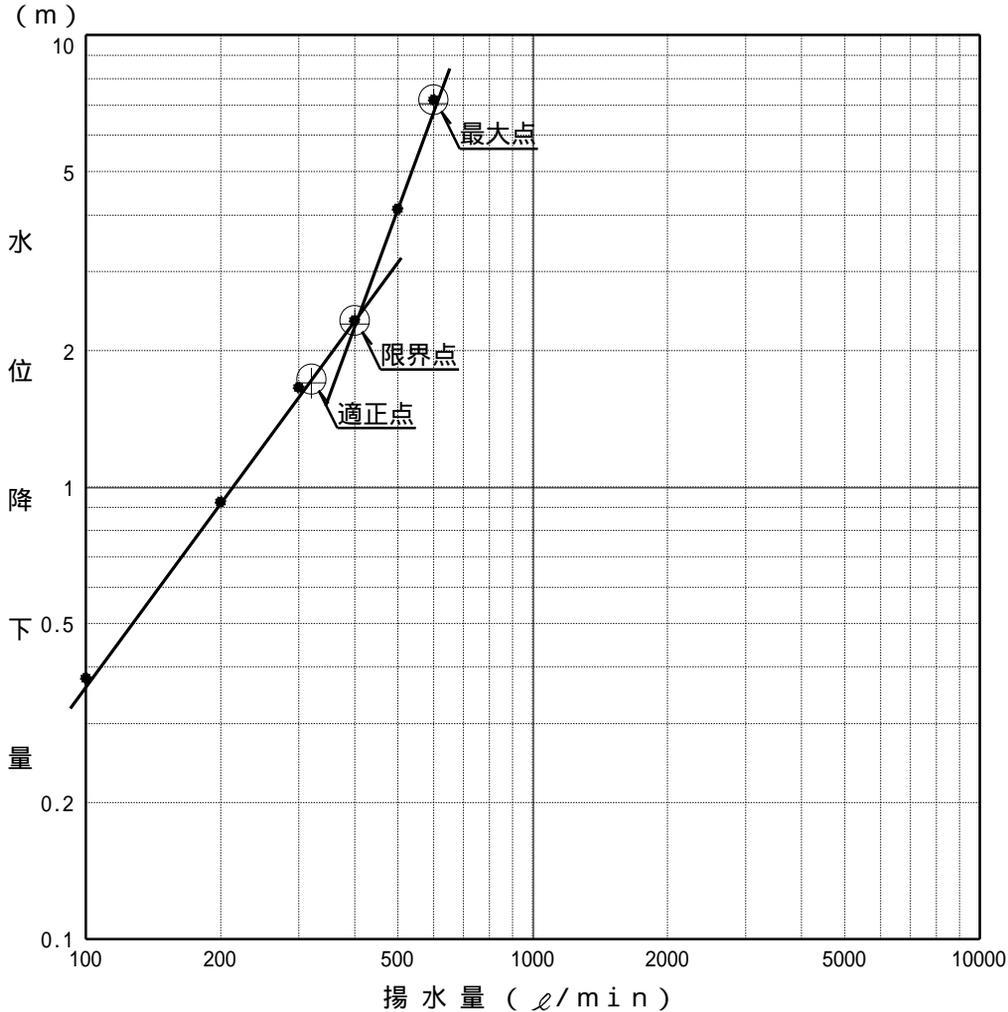

段階	揚水量		水位 (GL- m)	水位降下量 (m)	記事
	(ℓ / min)	(m ³ / day)			
1	100	144	6.60	0.37	第1段階
2	200	288	7.14	0.91	第2段階
3	300	432	7.86	1.63	第3段階
4	400	576	8.52	2.29	第4段階
5	500	720	10.27	4.04	第5段階
6	600	864	13.28	7.05	第6段階
7					
8					
9					
10					
